


ORGANISATION	NOM	PRÉSENCE
La Rédemption	Isabelle Dupont, mairesse	X
Saint-Cléophas	Monette Gauvin, conseillère	
Sainte-Irène	Alain Gauthier, maire	X
Saint-Zénon-du-Lac-Humqui	Réginald Duguay, maire	X
MRC de La Matapédia	Chantale Lavoie, préfète	
MRC de La Matapédia	Mario Lavoie, directeur général	X
MRC de La Mitis	Michel Côté, préfet	
MRC de La Mitis	Marcel Moreau, directeur général	
Propriétaires privés	Jacques Dupéré, propriétaire privé	
Groupes d'utilisateurs du territoire	André Blouin, président du Club de VTT de La Matapédia	X
Organismes de développement économique	Sébastien Jean, CLD de La Matapédia	X
Organismes de développement économique	Gino Boucher, CLD de La Matapédia	X
Organismes de protection de l'environnement	René Pelletier, président de l'Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche	X
EDF EN Canada	Ricardo Portillo, directeur – Réalisation	X
EDF EN Canada	Nathalie Dupont, agente de liaison	X
EDF EN Canada	Pierre Langlois, agent de liaison	X
EDF EN Canada	Michel Dumont, Santé et sécurité	X
EDF EN Canada	Gilles Gaudreault, Transport et logistique ( <i>par téléphone</i> )	X
EDF EN Canada	Daniel Giguère, directeur – Affaires publiques	X
EDF EN Canada	Simon Bélanger, coordonnateur de chantier	
Borea Construction	Louis Gervais, responsable technique	X
Bureau de la députée de Matapédia	Alexandre-Steve Guay, attaché politique	
PESCA Environnement	Maryse Tremblay, animatrice	X

POINT À L'ORDRE DU JOUR	RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ
1. Ouverture de la séance	<p>Mot de bienvenue.</p> <p>Après une première visite réalisée à l'automne 2011, les membres du comité de liaison présents à la séance de travail se sont rendus en avant-midi sur le chantier de construction afin de constater l'état d'avancement des travaux.</p> <p>Durant cette visite, les membres du comité de liaison ont pu faire la connaissance du nouveau directeur – Réalisation, Ricardo Portillo, de même que l'agent de liaison Pierre Langlois qui a pris le relais de Nathalie Dupont au cours des derniers mois. Nathalie revient graduellement au travail après un congé de maternité.</p>
2. Lecture et adoption du compte rendu de la séance de travail du 26 janvier 2012	<p>Le compte rendu est approuvé par les membres du comité de liaison sans modification.</p>
3. Bilan des travaux	<p>État d'avancement des travaux au 30 juin 2012 :</p> <p>Chemins : 65 % Fondations : 44 % Montage : 10 % Réseau collecteur : 29 % Poste de raccordement : 80 %</p>
4. Calendrier des travaux 2012	<p>Depuis mai : transport des composantes Juin à novembre : montage des éoliennes Août 2012 : mise sous tension initiale Décembre 2012 : livraison d'énergie à Hydro-Québec (phase I : 150 MW)</p> <p>L'équipe construction d'EDF EN Canada indique aux membres du comité que le calendrier des travaux est respecté jusqu'à maintenant. Si du retard est accumulé en semaine, des travaux de fin de semaine sont mis en branle de façon à respecter l'échéancier planifié.</p>
5. Mesures de sécurité – Visiteurs	<p>Le responsable Santé et sécurité chez EDF EN Canada, Michel Dumont, est présent à la séance de travail.</p> <p>EDF EN Canada et Borea Construction ont fait paraître une annonce dans les journaux locaux pour rappeler aux utilisateurs du territoire les risques associés à un chantier de construction. Les deux entreprises souhaitent que les membres du comité de liaison apportent leur soutien dans la diffusion de ce message de sécurité. Dans la majorité des cas, les utilisateurs du territoire adoptent un comportement adéquat et sécuritaire lorsqu'ils fréquentent le chantier et maintiennent des distances raisonnables entre eux et les activités et équipements.</p> <p>Plusieurs canaux de communication ont été établis entre l'entrepreneur général et les utilisateurs du territoire, notamment avec le Club de VTT de La Matapédia qui assure un affichage hebdomadaire des activités du chantier dans ses installations. Il en est de même pour les opérations de dynamitage, qui sont réalisées selon les règles de l'art : rayon de sécurité, route balisée, alarme sonore, etc.</p> <p>La vitesse de circulation est contrôlée par des opérations radar, et ce, tant pour les visiteurs que pour les travailleurs. Ces derniers reçoivent un avis écrit lors d'une première offense et sont renvoyés du chantier dès la deuxième offense.</p> <p>EDF EN Canada aborde également la question des vols de câbles électriques en rappelant aux membres du comité de liaison que toucher des câbles énergisés s'avérerait fatal pour toute personne qui déciderait de les voler.</p>

POINT À L'ORDRE DU JOUR	RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ
	La collaboration de tous est nécessaire pour assurer la sécurité sur le chantier et réduire au minimum les risques pour les travailleurs et les visiteurs qui le fréquentent.
6. Contenu régional – Borea Construction	Borea Construction présente les statistiques de main-d'œuvre et de machinerie locale du chantier du parc éolien du Lac-Alfred. Voir tableau à la fin du présent compte rendu.
7. Plan de transport des composantes	Le responsable Transport et logistique chez EDF EN Canada, Gilles Gaudreault, se joint à la séance de travail par téléphone afin de présenter aux membres du comité la logistique associée au transport des composantes vers le chantier du parc éolien du Lac-Alfred. La présentation aborde les détails de chacune des composantes d'une éolienne : provenance, poids et dimensions, mode de transport requis, restrictions diverses relatives au transport hors normes et coordination des livraisons sur le site.
8. Nouvelle image d'EDF EN Canada	EDF EN Canada présente la nouvelle image de l'entreprise. Ce changement est une conséquence naturelle de la pleine intégration d'EDF Energies nouvelles au sein du Groupe EDF (depuis août 2011). Le logo et les normes visuelles qui lui sont associées assurent la continuité entre toutes les entités d'EDF Energies Nouvelles. Le nom de l'entreprise et son statut en tant que filiale restent les mêmes.
9. Colloque de l'industrie éolienne – Prix pour EDF EN Canada	EDF EN Canada annonce aux membres du comité de liaison que l'entreprise a obtenu le prix <i>Parc éolien</i> au 3 <sup>e</sup> Gala québécois de l'industrie éolienne en juin. Alex Couture, directeur – Développement de projets chez EDF EN Canada a quant à lui remporté le titre de <i>Personnalité éolienne</i> lors du même événement.
10. Questions diverses	
a. Prochain appel d'offres	Les membres du comité de liaison souhaitent savoir si EDF EN Canada en sait davantage sur l'annonce d'un éventuel appel d'offres pour de l'énergie éolienne. EDF EN Canada indique que l'industrie éolienne travaille à convaincre le gouvernement de lancer rapidement un appel d'offres pour 700 MW d'énergie éolienne. L'entreprise confirme aux membres qu'elle est prête à soumettre, tout comme d'autres promoteurs, de nouveaux projets dans le cadre de cet éventuel appel d'offres.
11. Clôture de la séance	La prochaine séance de travail se tiendra le jeudi 1 <sup>er</sup> novembre 2012 en après-midi au bureau d'EDF EN Canada à Saint-Cléophas.

# 6. CONTENU RÉGIONAL – BOREA CONSTRUCTION

Main-d'oeuvre locale en heures (cumulatif)

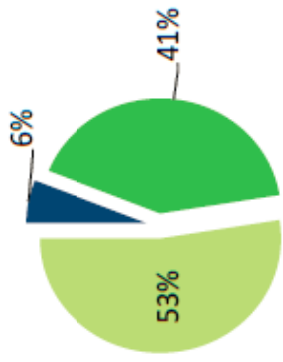


■ Mitis ■ La Matapédia ■ Autre

Main-d'oeuvre en heures par région (cumulatif)




■ Bas-Saint-Laurent ■ Gaspésie ■ Autre

Machinerie locale en heures (cumulatif)

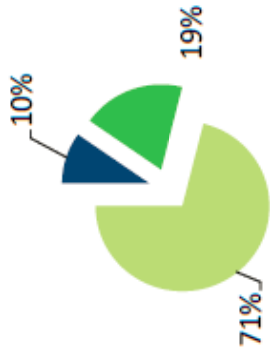

■ Mitis ■ La Matapédia ■ Autre

Machinerie en heures par région (cumulatif)



■ Bas-Saint-Laurent ■ Gaspésie

